

INFORME TÉCNICO

Tipo de trabajo: Instalación
Fecha: 2026-07-31
Técnico: Ociel Arcos

Cliente

Nombre: Cliente demo

Trabajo realizado

Instalación de un punto de videovigilancia en poste, con alimentación autónoma por panel solar.

Se montó el brazo soporte y se fijó la cámara bullet IP orientada al eje del camino. Se instaló el gabinete de comunicaciones con su caja de conexiones estanca, se canalizó el cableado por conduit y se dejó reserva de fibra en el poste para mantenciones futuras.

Se ejecutó el empalme y la conectorización de la fibra óptica en bandeja, y se verificó el enlace y la transmisión de imagen desde el punto hasta la central. Se ajustó el encuadre, se probó el respaldo por batería y el sistema quedó operativo.

Verificaciones en terreno

- ☒ Enlace de datos probado hasta la central
- ☒ Imagen verificada y encuadre ajustado
- ☒ Fibra empalmada, protegida y con reserva
- ☒ Alimentación solar y respaldo por batería operativos

Firmas



Técnico
Ociel Arcos



Cliente



Fotografías

Montaje



Instalación de la cámara y la caja de conexiones en el poste

Equipo instalado




Cámara bullet IP fijada al brazo, orientada al eje del camino

Canalización



Caja de conexiones estanca y cableado con reserva en el poste

Fibra óptica

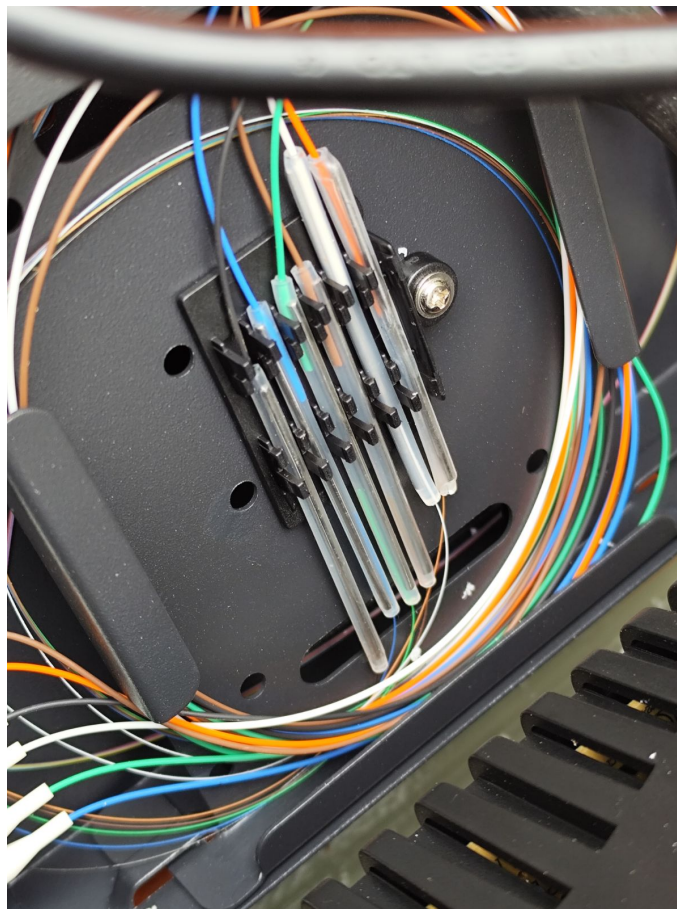

Empalme y conectorización en bandeja, hebras ordenadas por color

Punto terminado



Punto operativo con panel solar, gabinete y cámaras en servicio
